

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

 arquitectura y construcción	PROYECTO:	CASETA PASADENA	SEMANA No. 08
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	
	GERENCIA DE PROYECTO	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 08 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO	

[illegible]


PROBLEMAS QUE PUEDEN VOLVERSE CRÍTICOS	ESTATUS	FECHA LÍMITE	RESPONSABLE
Apegarse al programa de obra y de suministros	En proceso	--	Todos

CONCEPTO	PROGRAM.	REAL	VARIACION	PROGRAMADO VS REAL
CIMENTACION	100.00%	95.04%	-4.96%	100.00% 95.04%
ALBAÑILERIA	89.99%	66.18%	-23.81%	89.99% 66.18%
PLAFONES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
ACABADOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
ESTRUCTURA TECHUMBRE	83.62%	79.30%	-4.32%	83.62% 79.30%
HERRERIAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
CARPINTERIA Y CANCELERIA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	76.14%	65.72%	-10.42%	76.14% 65.72%
SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS	4.60%	1.13%	-3.47%	4.60% 1.13%
CONTROL DE ACCESO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%
LETRERO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00% 0.00%

REPORTE DE ESTATUS SEMANAL

	PROYECTO:	CASETA PASADENA	SEMANA No.
	UBICACIÓN:	HERMOSILLO, SONORA	08
	GERENCIA DE PROYECTO:	METTA GROUP	
	FECHA DEL PERIODO:	SEMANA 08 - DEL 01 AL 06 DE JUNIO	

PROGRAMA MAESTRO

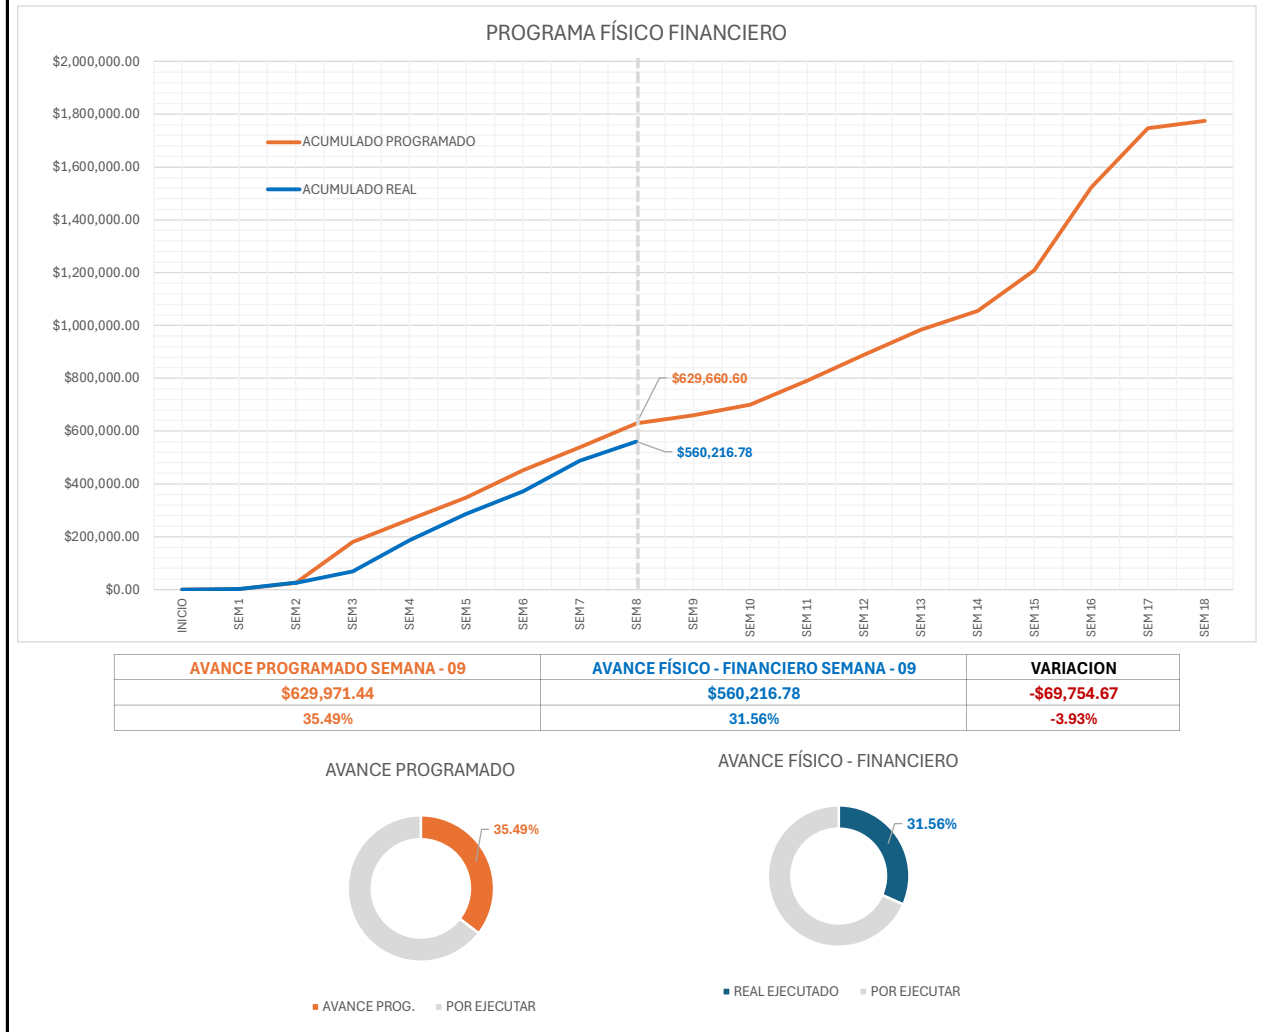

ABASTECIMIENTOS

SEMANA 08			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Cemento	1-jun	Suministrado	Alta
Varilla	1-jun	Suministrado	Medio
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS			
CONCEPTO	FECHA REQUERIDA	ESTATUS	IMPORTANCIA
Pago a grua de montajes estructura	15-jun	Solicitado	Alta
PTR 6x6x3/16"	16-jun	Se solicitará Lunes	Alta
Polines 6"	16-jun	Se solicitará Lunes	Medio
Cemento	18-ago	Se solicitará Miercoles	Medio
Piedra laja para muros	18-jun	Se solicitará Miercoles	Medio
